




## 2017 Yılı Burdur Geneli Kamu Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 344
<b>Proje Bedeli</b>	: 2.292.654.560 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 453.260.646 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 339.732.442 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 191.885.163 TL





## Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 20
<b>Proje Bedeli</b>	: 991.443.000 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 83.774.000 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 42.842.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 35.898.000 TL

**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
**Keçiborlu-Burdur-Çeltikçi-Kızılkaya Ayr. Yolu**



Yatırımın Başlama Tarihi	<b>2004</b>
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	189.688.000
Önceki Yıllar Harcaması	24.747.000
2017 Yılı Ödeneği	26.998.000
2017 Yılı Harcaması	26.998.000
Karakteristiği	BY
Açıklama	Toplam uzunluğu 96 km, Burdur ilindeki uzunluğu 78 km' olan projenin tamamı BY-BSK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında Bucak Şehir Geçişinde Sanayi ve Kocaeliler Köprüsü kavşaklarının tamamlanması hedeflenmektedir.

**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
**Kızılkaya Ayr.-Antalya Yolu (Bsk)**



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	<b>2004</b>
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	<b>2020</b>
<b>Proje Tutarı</b>	<b>70.731.000</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>612.000</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>0</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>0</b>
<b>Karakteristiği</b>	<b>BY</b>
<b>Açıklama</b>	Toplam uzunluğu 60 km, Burdur İlindeki uzunluğu 6 km olan sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.



**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
**Antalya-Korkuteli-Söğüt-Çavdır-2. Bl. Hd.**



Yatırımın Başlama Tarihi	2006
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	148.086.000
Önceki Yıllar Harcaması	2.417.000
2017 Yılı Ödeneği	3.312.000
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	BY
Açıklama	Toplam uzunluğu 132 km, Burdur ilindeki uzunluğu 47 km olan yolun tamamı SK/BY olarak tamamlanmıştır. SK/BY olarak tamamlanan kesimlerin BSK üstyapı ihalesi Genel Müdürlük tarafından 29.07.2016 tarihinde yapılarak, 09.02.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
(Korkuteli-Çavdır) Ayr.-(Fethiye-Kalkan) Ayr.



Yatırımın Başlama Tarihi	2011
Yatırımın Bitiş Tarihi	2018
Proje Tutarı	15.477.000
Önceki Yıllar Harcaması	208.000
2017 Yılı Ödeneği	0
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	BY / BSK
Açıklama	Toplam uzunluğu 71 km , Burdur İlindeki uzunluğu 3 km'dir. Tamamı sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet vermektedir. (Korkuteli-Çavdır)Ayr.-Seydikemer Yolunun Karabel Tüneli ile birlikte BSK'lı Bölünmüş Yol ihalesi Genel Müdürlük tarafından 15.06.2016 tarihinde yapılmış, sözleşmesi 21.11.2016 tarihinde imzalanarak çalışmalara başlanmıştır. Muğla İlinde çalışmalara başlanmıştır.

## Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü

### Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu



Yatırımın Başlama Tarihi	2013
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	175.386.000
Önceki Yıllar Harcaması	51.006.000
2017 Yılı Ödeneği	8.900.000
2017 Yılı Harcaması	8.900.000
Karakteristiği	BY/SK
Açıklama	Toplam uzunluğu 92 km olan yolun 44 km'si BY/BSK, 20 km'si BY/SK olmak üzere 64 km'si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 7 km BY-BSK, 5 km BY/SKÜBSK yapılması ve Karabel tüneline çalışılması hedeflenmiş, 5 BY-BSK, 2 km BY/SKÜBSK tamamlanmıştır. Çalışmaların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.


**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
(Antalya-Manavgat)Ayr.-Dereboğazı-Ağlasun Ayr.



Yatırımın Başlama Tarihi	2015
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	214.910.000
Önceki Yıllar Harcaması	484.000
2017 Yılı Ödeneği	0
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	BY/BSK
Açıklama	Mevcut yol uzunluğu 114 km, proje uzunluğu 104 km'dir. Burdur ilindeki mevcut yol uzunluğu 36 km, proje uzunluğu 35 km'dir. TY olarak hizmet vermekte olan bu yol BSK Kaplamalı olarak tamamlanmıştır. Isparta ve Antalya illerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları, Burdur ili sınırlarında kalan kesimde BY/BSK proje çalışmaları devam etmektedir. Güzergahta 20 km uzunluğunda 8 adet çift tüp, 1 adet tek tüp tünel, 2 km uzunluğunda 23 adet köprü ile birlikte proje çalışmaları devam etmektedir. yapım çalışmaları tamamlandığında Güzergahta 10 km, Burdur İlinde 1 km kısalma olacaktır.



## Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya-Burdur)Ayr.-Kızılkaya-Korkuteli- Elmalı-Finike

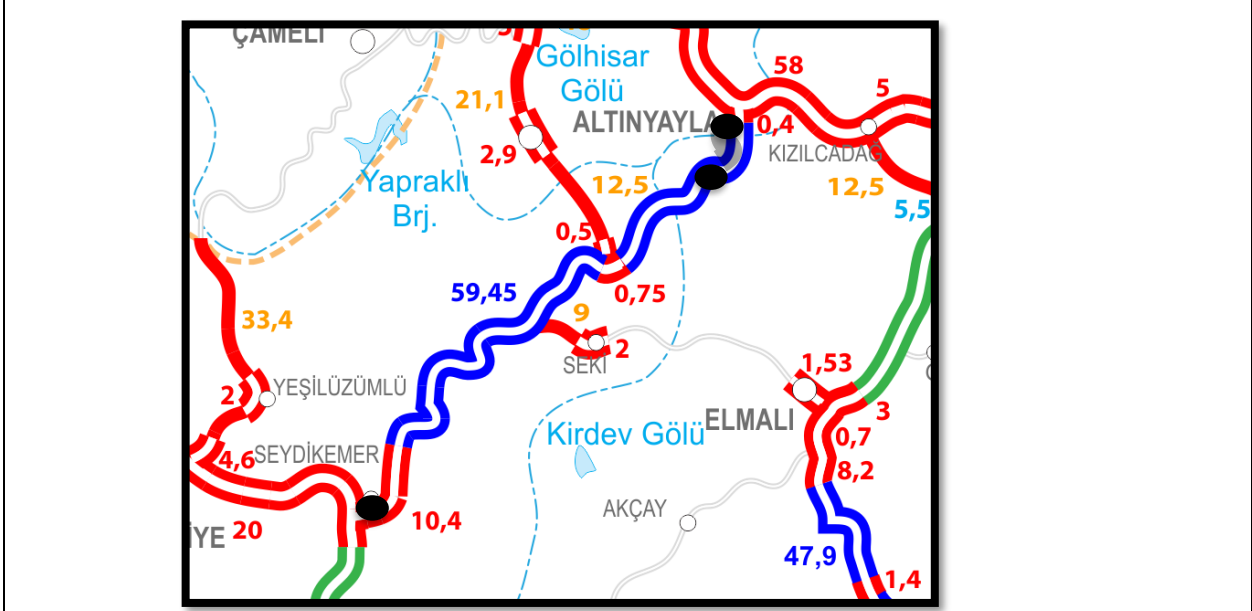

Yatırımın Başlama Tarihi	1974
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	13.404.000
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	0
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	BY/BSK
Açıklama	Projenin toplam uzunluğu 159 km, Burdur İlindeki uzunluğu 9 km'dir. Sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kızılkaya Ayr.-Bozova-Korkuteli-Elmalı arası 2017 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Burdur Ayr.-Kızılkaya-Korkuteli BY/BSK ihalesi 05.05.2017 tarihinde, Korkuteli-Elmalı arası 49 km' lik kesimin ihalesi 26.04.2017 tarihinde yapılmıştır.


**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
(Burdur-Kemer)Ayr.-Hacılar-Yeşilova



Yatırımın Başlama Tarihi	2012
Yatırımın Bitiş Tarihi	2018
Proje Tutarı	18.224.000
Önceki Yıllar Harcaması	2.175.000
2017 Yılı Ödeneği	2.020.000
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	TY/SK
Açıklama	BURDUR ilindeki toplam uzunluğu 33 km olan yolun 1 km'si BY-SK, 32 km TY-SK olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5 km tek yol üzeri sathi kaplama üstü BSK yapılması hedeflenmektedir. BSK üstyapı ihalesi 19.01.2017 tarihinde yapılmış, 02.06.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

# Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü


## Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Denizli-Burdur Kesimi)

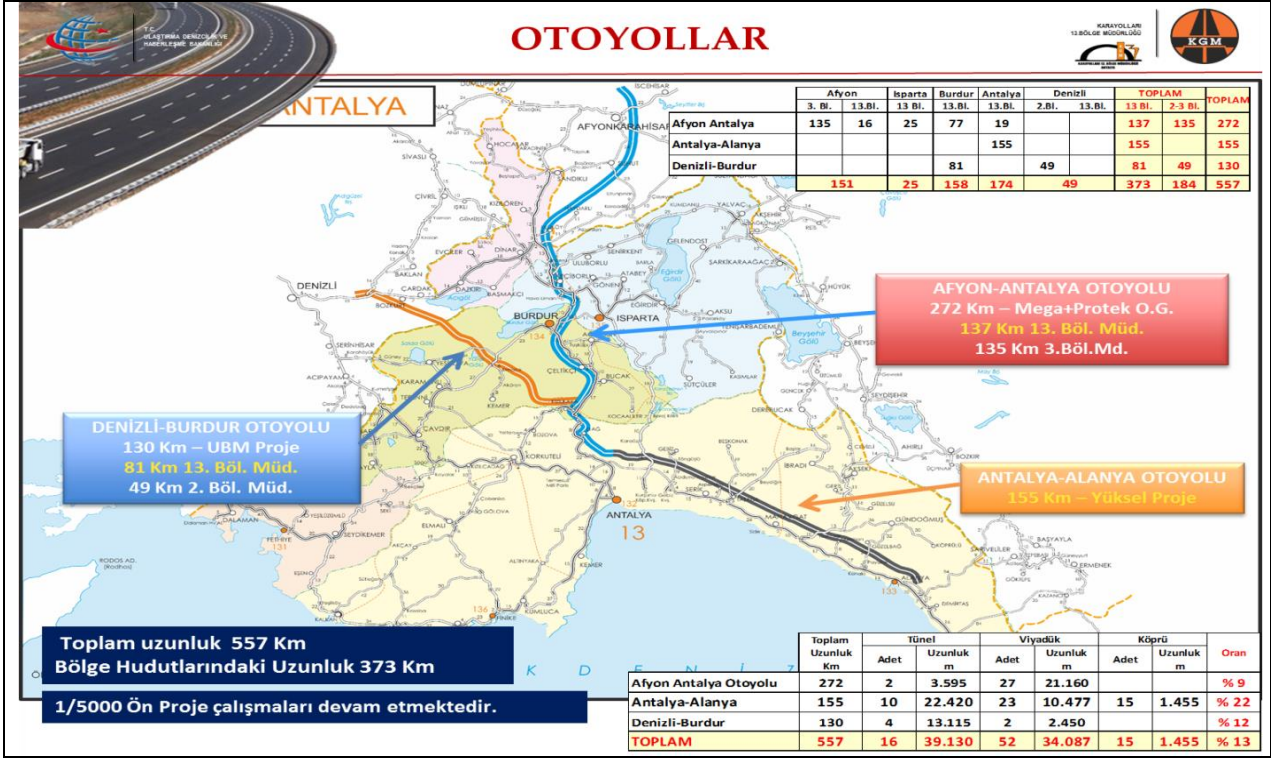

Yatırımın Başlama Tarihi	2012
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	9.598.000
Önceki Yıllar Harcaması	1.051.000
2017 Yılı Ödeneği	750.000
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	OY/BY
Açıklama	Toplam uzunluğu 130 km olan projenin BURDUR ili sınırlarındaki uzunluğu 81 km olup, ön proje çalışmaları devam etmektedir.

# Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü

## (Ankara-İzmir)Ayr.-Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Otoyolu

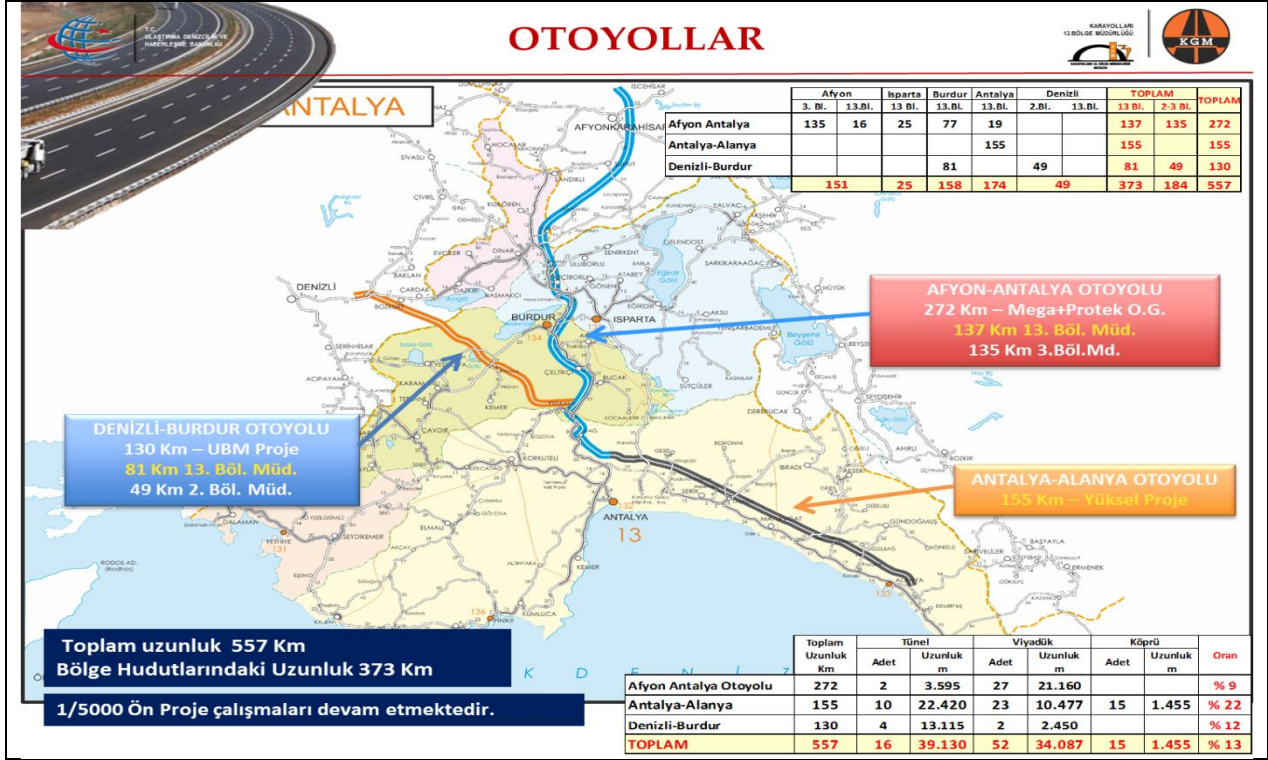

Yatırımın Başlama Tarihi	2012
Yatırımın Bitiş Tarihi	2018
Proje Tutarı	5.192.000
Önceki Yıllar Harcaması	1.074.000
2017 Yılı Ödeneği	182.000
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	OY/BY
Açıklama	Toplam uzunluğu 272 km olan projenin BURDUR ili sınırlarındaki uzunluğu 77 km olup, ön proje çalışmaları devam etmektedir.



**Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü**  
**131. Şube Söğüt Bakımevi İnşaatı**



Yatırımın Başlama Tarihi	2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	2020
Proje Tutarı	1.370.000
Önceki Yıllar Harcaması	
2017 Yılı Ödeneği	210.000
2017 Yılı Harcaması	
Karakteristiği	
Açıklama	Devam Ediyor

## Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü

### Diğer Yatırımlar



Yatırımın Adı	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödene ği	2017 Yılı Harcaması
Isparta-Burdur İl Sınırı Ağlasun Mehmet Akif Ersoy Üniv. Geçince Senkronize Flaş Yapılması	2016 2017	80.000	80.000	80.000
Isparta-Burdur İl Sınırı Ağlasun Gökçebağ Geçışı Orta Refüje Çit Yapılması ve Yaya Üst Geçışı Yapılması	2017 2017	70.000	70.000	
Isparta-Burdur İl Sınırı (Burdur-Antalya) Köroğlu Beli Senkronize Flaş Yapılması	2017 2017	80.000	80.000	
Isparta-Burdur İl Sınırı (Burdur-Antalya) Peçenek Beli Senkronize Flaş Yapılması	2017 2017	80.000	80.000	
Denizli-Burdur İl Sınırı Gölhisar İYA Çomaklı Beli Senkronize Flaş Yapılması	2017 2017	80.000	80.000	
Isparta-Burdur İl Sınırı Ağlasun DYA Burdur Şehir Geçışı Termik Santral Kavşağı Burdur Yolu Yaklaşımı Senkronize Flaş Yapılması	2017 2017	80.000	80.000	
Gölhisar-Altınyayla-Bekçiler-Elmalı-Dalaman-Fethiye Kesimlerinde Binder Takviye Yapılması	2017 2017	3.000.000		
(Isparta-Antalya)AYR Ağlasun-(Burdur-Antalya) AYR Binder Takviye Yapılması	2017 2017	9.907.000		
Burdur Afalt Kaplama Yapımı Yol Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi, Trafik Hizmet ve Bakım Onarım Hizmetleri	2017 2017	36.000.000		



## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 7
<b>Proje Bedeli</b>	: 57.181.004 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 32.682.279 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 24.091.980 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 11.226.097 TL


## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>ÇELTİKÇİ İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	18.07.2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	14.05.2017
<b>PROJENİN TUTARI</b>	1.326.370,00
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	494,142.87
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	832,227.00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	789,458.00
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	İÇMESUYU
<b>AÇIKLAMA</b>	İş bitti. 13.06.2017 tarihinde Geçici kabulü yapıldı.



## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



**İLBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>KARAMANLI İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	24.11.2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	08.04.2018
<b>PROJENİN TUTARI</b>	5,423,222.00
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	5,016,480.35
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	İÇMESUYU
<b>AÇIKLAMA</b>	Yer teslimi 24.11.2016 tarihinde yapıldı.

## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>GÖLHİSAR İÇMESUYU KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	02.10.2015
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	20.03.2018
<b>PROJENİN TUTARI</b>	35,561,528.00
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	20,886,521.68
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	14,675,006.00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	8,614,151.98
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	İÇMESUYU KANALİZASYON ve YAĞMURSUYU
<b>AÇIKLAMA</b>	İş devam ediyor.

## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>BUCAK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	28.09.2015
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	14.02.2018
<b>PROJENİN TUTARI</b>	12,904,000.00
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	11,158,220.98
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1,745,779.00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ASFALT KAPLAMA
<b>AÇIKLAMA</b>	İş devam ediyor.

## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>TEFENNi OTOGAR YAPIM İŞİ</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	24.10.2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.05.2017
<b>PROJENİN TUTARI</b>	1,225,400.00
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	143,396.30
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1,082,004.00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	1,082,004.00
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	OTOGAR İNŞAATI
<b>AÇIKLAMA</b>	İş bitti. Geçici kabulü 11.05.2017 tarihinde yapıldı.



## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



YATIRIMIN ADI	GÖLHİSAR(BURDUR) YOL VE/VEYA KALDIRIM İNŞAATI CUMHURİYET CADDESİ ASFALT YAPIM İŞİ
YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ	30.05.2017
YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ	29.06.2017
PROJENİN TUTARI	320,977.70
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	320,977.70
2017 YILI HARCAMASI	320,977.70
KARAKTERİSTİĞİ	KALDIRIM ve ASFALT YAPIMI
AÇIKLAMA	İş bitti. Geçici kabulü 05.07.2017 tarihinde yapıldı.

## İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü



<b>YATIRIMIN ADI</b>	<b>GÖLHİSAR(BURDUR) YOL VE/VEYA KALDIRIM İNŞAATI CUMHURİYET CADDESİ YOL YAPIM İÇİN TEMEL MALZEME SERİLMESİ VE ŞIKIŞTIRILMASI</b>
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	30.05.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	29.06.2017
<b>PROJENİN TUTARI</b>	419,507.64
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	419,507.64
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	419,507.64
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	KALDIRIM ve YOL YAPIMI
<b>AÇIKLAMA</b>	İş bitti. Geçici kabulü 05.07.2017 tarihinde yapıldı.



## Antalya Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 1
<b>Proje Bedeli</b>	: 1.518.528 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 500.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: --



## Antalya Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü

### Kadastro Harita Bilgi Güncellemesi İşi



Yatırımın Başlama Tarihi	01.08.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	23.12.2018
Proje Tutarı	1,518,528.00
Önceki Yıllar Harcaması	0.00
2017 Yılı Ödeneği	500,000.00
2017 Yılı Harcaması	0.00
Karakteristiği	
Açıklama	6-19 ihale paket ve BRD-BCK II sözleşme referans numaralı "Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi"



## Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 3</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 301.608 TL</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: --</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 301.608 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: --</b>



## ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gölhisar Himmet Dede Camii Yıkılıp Yeniden Yapıtılmasına Yönelik Proje Hizmet Alımı



Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	32.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yılı Ödeneği	32.000,00 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiği	
Açıklama	Camiinin yıkılıp yeniden yapılması öncesi hazırlanacak projeler için ihale dosyası hazırlanmaktadır.

**ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Hoca Bali Hamamı Proje Hazırlanması Hizmet Alımı



Yatırımın Başlama Tarihi	09.09.2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	06.01.2017
Proje Tutarı	35.800,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yılı Ödeneği	35.800,00 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiği	
Açıklama	Projeler tamamlanmış olup Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur.

**ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Veli Dede Türbesi Restorasyonu



Yatırımın Başlama Tarihi	28.06.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	24.04.2018
Proje Tutarı	233.808,27 TL
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yılı Ödeneği	233.808,27 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiği	
Açıklama	Yer Teslimi Yapılmıştır.





## Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 10
<b>Proje Bedeli</b>	: 32.032.000 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 32.032.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 11.074.000 TL

## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



<b>Yatırım Başlama Tarihi</b>	01/01/2017
<b>Yatırım Bitiş Tarihi</b>	31/12/2017
<b>PROJE TUTARI</b>	5.920.000 TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	5.920.000 TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	1.214.000 TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ
<b>AÇIKLAMA</b>	594 ha ağaçlandırma, 700 ha toprak muhafaza, 42 ha rehabilitasyon, 39 ha maden sahalarının rehabilitasyonu ve 8.637 ha bakım çalışması yapılacaktır.



## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	11.777.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	11.777.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	6.616.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ENDÜSTRİYEL VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİ PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje kapsamında 203.500 m3 endüstriyel odun ve 51.000 ster yakacak odun üretilecektir.

## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	649.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	649.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	115.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIMI PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje çalışmaları kapsamında 1.500.000 adet fidan üretimi 1.950.000 adet fidan bakımı yapılacaktır.





## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	1.100.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	1.100.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	1.074.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ORKÖY PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje kapsamında 60 aileye süt sığırcılığı için kredi verilecektir.



## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	55.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	55.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	35.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ORMAN KORUMA PROJESİ
AÇIKLAMA	2.000 ha sahada orman zararlıları ile mücadele ve 300 adet kuş yuvası yapılacaktır.



## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	287.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	287.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	110.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje kapsamında İdare Binası, Sosyal Tesis ve Depo Binası ve depo ihatası onarımı yapılacaktır.

## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	4.802.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	4.802.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	258.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ORMAN KORUMA VE ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje kapsamında 1 adet ilk müdahale ekip binası yapılacak ve 1 adet Yangın Gözetleme Kulesi, 1 adet Toplu koruma Ekip Binası, 200 ha YARDOP, 17 adet su tankeri alımı yapılacaktır.

## ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Başlama Tarihi	01/01/2017
Yatırım Bitiş Tarihi	31/12/2017
PROJE TUTARI	4.131.000 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-
2017 YILI ÖDENEĞİ	4.131.000 TL
2017 YILI HARCAMASI	119.000 TL
KARAKTERİSTİĞİ	ORMAN YOLLARI YAPIMI VE TAMİR BAKIM PROJESİ
AÇIKLAMA	Proje kapsamında 40 km orman yolu,46 km orman yolu büyük onarımı, 29 km orman yolu üst yapısı,70 km sanat yapısı,1 adet yol panı,115 km yol aplikasyonu,13 km traktör yolu ve 3.910 km yolun tamir bakımı yapılacaktır.



## **DSİ 18. Bölge Müdürlüğü**

### **Yatırımları**

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 64
<b>Proje Bedeli</b>	: 554.456.656 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 101.353.684 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 98.578.213 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 96.639.567 TL



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Burdur İçme Suyu İshale Hattı



YATIRIMCI KURULUŞ:	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
Yatırımın Başlama Tarihi:	05.04.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi:	29.06.2018
Proje Tutarı:	24.721.430
Önceki Yıllar Harcaması:	0
2017 Yılı Ödeneği:	5.000.000
2017 Yılı Harcaması:	4.997.567
Karakteristiği:	İçme Suyu
Açıklama:	Fiziki gerçekleşme % 20

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Burdur-Çavdır Belkaya Barajı Malzeme Ocakları Rehabilitasyonu



YATIRIMCI KURULUŞ:	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
Yatırımın Başlama Tarihi:	
Yatırımın Bitiş Tarihi:	
Proje Tutarı:	400.000
Önceki Yıllar Harcaması:	0
2017 Yılı Ödeneği:	200.900
2017 Yılı Harcaması:	0
Karakteristiği:	Rehabilitasyon
Açıklama:	17.07.2017 tarihinde ihale edilmiştir ihale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KARAMANLI SULAMASI YENİLEME**



YATIRIMCI KURULUŞ:	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
Yatırımın Başlama Tarihi:	16.10.2015
Yatırımın Bitiş Tarihi:	12.07.2018
Proje Tutarı:	48.154.985
Önceki Yıllar Harcaması:	21.535.511
2017 Yılı Ödeneği:	15.050.000
2017 Yılı Harcaması:	14.909.171
Karakteristiği:	Sulama
Açıklama:	Fiziki gerçekleşme % 99

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BELENLİ GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	21.08.2015
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	28.04.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	10.975.574
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	10.349.707
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	425.867
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	235.843
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇAVDIR KÜÇÜKALAN GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	15.08.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	04.09.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	14.254.198
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	994.107
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	7.885.653
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	7.885.535
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 30

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇELTİKÇİ BAĞSARAY GÖLETİ SULAMASI İLAVE SAHALAR**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	8.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇELTİKÇİ BAĞSARAY GÖLETİ SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	04.05.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	29.04.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	4.869.548
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	4.164.548
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	5.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEFENNİ GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	4.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	500
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	24.07.2017 tarihinde ihale edilmiştir, İhale süreci devam ediyor.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞLASUN MAMAK KURTULUŞ GÖLETİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	06.06.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	07.05.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	12.731.463
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ALTINYAYLA GÖLETİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	25.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	11.07.2017 tarihinde ihale edilmiştir, İhale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK KIZILSU GÖLETİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	25.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK TAŞYAYLA GÖLETİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	15.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇAVDIR AMBARCI KOCA MUSTAFA GÖLETİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	12.05.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	12.04.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	8.525.701
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇAVDIR KÜÇÜKALAN GÖLETİ SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	8.500.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	500
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇAVDIR SÖĞÜT 2 GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	23.06.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	19.04.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	10.714.990
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 5

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇELTİKÇİ BAĞSARAY GÖLETİ MALZEME OCAKLARI REHABİLİTASYONU**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	8.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	21.08.2017 tarihinde ihale edilecektir.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇELTİKÇİ BAĞSARAY GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	15.05.2015
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	08.02.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	33.811.616
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	21.973.086
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	13.497.418
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	13.497.354
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 99

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÖLHİSAR YUSUFCA GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	05.01.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	17.10.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	11.089.437
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	89.437
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar devam ediyor.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ AZİZİYE KOCAPINAR GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	28.03.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	03.10.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	8.393.110
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	5.292.509
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.603.472
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.603.451
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 99

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
TEFENNİ SAZAK GÖLETİ



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	25.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEFENNİ YAYLAKÖY GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	15.08.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	04.09.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	14.714.246
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	628.302
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	35.944
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 10

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
TEFENNİ YAYLAKÖY GÖLETİ VE SULAMASI



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	10.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	700
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	24.07.2017 tarihinde ihale edilmiştir, İhale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA GÜNEY GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	07.10.2013
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	01.11.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	21.791.355
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	11.443.414
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	5.752.383
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	5.752.380
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 90



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA KAYADIBİ GÖLETİ VE SULAMASI**



YATIRIMCI KURULUŞ:	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
Yatırımın Başlama Tarihi:	09.09.2016
Yatırımın Bitiş Tarihi:	08.12.2018
Proje Tutarı:	10.285.781
Önceki Yıllar Harcaması:	348.597
2017 Yılı Ödeneği:	1.813.184
2017 Yılı Harcaması:	1.812.772
Karakteristiği:	Sulama
Açıklama:	Fiziki gerçekleşme % 20



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA SALDA GÖLETİ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	04.07.2014
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	27.10.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	11.794.945
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	848.829
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	2.040.228
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	2.040.226
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 15

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-182 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNE KORKULUK YAPILMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	2.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	900
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	2017 Yılı içerisinde ihale edilecektir.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-BUCAK İLÇE MERKEZİ 4.KISIM**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	14.03.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	12.02.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	4.883.397
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	3.939.247
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	50.543
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Geçici Kabul yapılmıştır.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ GÖKÇEBAĞ KÖYÜ ARAZİLERİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	01.03.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	30.01.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	4.194.528
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	3.683.266
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	557.262
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	556.305
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Geçici Kabul Aşamasındadır.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	07.04.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	27.04.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	9.828.982
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.749.548
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.749.546
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 5

**DEVLET SU İŐLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ**  
**BURDUR-AĐLASUN 2.KISIM**



<b>YATIRIMCI KURULUŐ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	06.03.2017
<b>Yatırımın Bitiő Tarihi:</b>	26.03.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	4.680.466
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneđi:</b>	2.039.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	2.038.163
<b>Karakteristiđi:</b>	Taőkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekteőme % 30

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-ALTINYAYLA KIZILYAKA KÖYÜ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	29.12.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	18.01.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	4.124.190
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.090.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.085.605
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 30

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-BUCAK TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	01.02.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	21.02.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	3.081.392
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	3.346.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	3.337.629
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 99



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-BUCAK TAŞYAYLA KÖYÜ 2.KISIM**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	20.03.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	09.04.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	1.180.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.199.200
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	850.149
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 41

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-ÇAVDIR TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	18.11.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	02.04.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	7.165.558
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödenegi:</b>	1.425.610
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.425.603
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 25



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-ÇAVDIR TAŞKIN KORUMA 2.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	01.02.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	21.02.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	6.285.270
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.005.720
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.005.710
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 15

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-ÇELTİKÇİ TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	10.11.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	25.03.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	2.858.973
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	800.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	799.763
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 30



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-GÖLHİSAR DALAMAN ÇAYI ve KOLLARI 1.KISIM**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	02.02.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	22.02.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	5.762.749
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	4.478.700
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	4.478.688
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 72

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-GÖLHİSAR ELMALİYURT KÖYÜ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	19.04.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	06.10.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	9.108.128
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	5.363.801
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.182.396
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.181.265
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 73

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-KARAMANLI TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	01.08.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	14.12.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	3.948.889
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	2.644.815
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.405.074
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.401.471
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Geçici kabul aşamasındadır.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-KARAMANLI TAŞKIN KORUMA 2.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	09.08.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	22.12.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	6.950.865
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	2.262.656
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	4.085.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	4.084.165
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 70



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-KEMER İLÇE MERKEZİ ve AKPINAR MEVKİİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	11.11.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	26.03.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	1.084.457
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	11.457
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 5

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-KEMER TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	06.10.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	18.02.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	4.754.896
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.400.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.331.284
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 27

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ ASKERİYE KÖYÜ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	07.10.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	19.12.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	4.642.313
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	398.385
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.827.190
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.827.188
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 33



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ BEREKET ve KÖKEZ KÖYLERİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	08.10.2015
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	17.09.2017
<b>Proje Tutarı:</b>	1.508.882
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	932.231
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	126.651
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 75



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ KÖYLERİ TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	24.02.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	16.03.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	8.237.344
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	5.700.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	5.696.171
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 65

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ KUMLUCA KÖYÜ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	08.12.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	22.04.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	909.298
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	509.298
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	355.400
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 35



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-MERKEZ SULUDERE KÖYÜ ARAZİLERİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	13.01.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	03.02.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	4.709.380
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	2.200.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	2.137.923
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 42

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-YEŞİLOVA TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	02.09.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	15.01.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	5.878.109
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	1.024.574
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	2.822.450
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	2.822.420
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 65



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-YEŞİLOVA TAŞKIN KORUMA 1.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	01.09.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	14.01.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	5.155.234
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	2.218.485
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.300.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.292.541
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 67

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-YEŞİLOVA TAŞKIN KORUMA 3.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	09.09.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	22.01.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	5.192.525
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	878.553
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.491.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.490.954
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleşme % 44

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-YEŞİLOVA TAŞKIN KORUMA 4.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	09.12.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	23.04.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	1.788.365
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 5



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BURDUR-YEŞİLOVA TAŞKIN KORUMA 5.GRUP**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	02.02.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	22.02.2019
<b>Proje Tutarı:</b>	4.735.045
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	1.635.590
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	1.635.580
<b>Karakteristiği:</b>	Taşkın Koruma
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 28



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KARAMANLI KAĞILCIK 1. 2. VE 3. KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	4.400.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	440.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	440.000
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İhale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ASKERİYE 1. VE 2. KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	2.400.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	240.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	240.000
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İhale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ÇENDİK 1.KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	500.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İhale süreci devam ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
TEFENNİ MERKEZ 1. 2. VE 3. KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	2.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	200.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	200.000
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	İhale süreci devam ediyor.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK ANBAHAN REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	06.12.2016
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	20.04.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	1.209.399
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	429.461
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	779.938
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	441.745
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 72

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ AŞAĞIMÜSLÜMLER DÜĞER SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	18.600.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	500
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	2017 Yılı içerisinde ihale edilecek.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ BAŞMAKÇI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	24.07.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	16.10.2020
<b>Proje Tutarı:</b>	2.622.491
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar Devam Ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ GÜNALAN REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	21.07.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	13.10.2020
<b>Proje Tutarı:</b>	3.593.680
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar Devam Ediyor.



**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ SULUDERE REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	7.393.850
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	10.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ YAYLABELİ REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	18.07.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi:</b>	10.10.2020
<b>Proje Tutarı:</b>	2.062.345
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Çalışmalar Devam Ediyor.

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA HARMANLI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	10.11.2016
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	25.03.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	1.297.277
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	75.000
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	Fiziki gerçekleştirme % 5

**DEVLET SU İŞLERİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA ÖRENCİK REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI**



<b>YATIRIMCI KURULUŞ:</b>	<b>DSİ 18.Bölge Müdürlüğü</b>
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Yatırımın Başlama Tarihi:</b>	
<b>Proje Tutarı:</b>	8.000.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	0
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	0
<b>Karakteristiği:</b>	Sulama
<b>Açıklama:</b>	29.05.2017 tarihinde ihale edilmiştir ihale süreci devam ediyor.





## TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 6</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 33.553.835 TL</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: --</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: --</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: --</b>

## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



### PROJE ADI: Aksa Antalya – Aksa - Bucak EİH

<b>Toplam Direk Sayısı</b>	24 Adet Çift Devre – 110 Adet Tek Devre
<b>Toplam Uzunluk</b>	10,2 km Çift Devre – 41 km Tek Devre
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	07.112013
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2015
<b>Proje Karakteristiği</b>	154 kV 10,2 km Çift devre + 41 km Tek devre 1272 MCM
<b>Toplam Maliyet</b>	8.765.707,00 TL

## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



PROJE ADI: 154 kV Burdur TM Tevsiat Metal Clad + Kumanda Binası

<b>Toplam Kapalı Alan</b>	1143 m <sup>2</sup>
<b>Düzenlenen Açık Alan</b>	27500 m <sup>2</sup>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	30.04.2014
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2015
<b>Toplam Maliyet</b>	4.994.064,70 TL



## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



PROJE ADI: 154 kV Burdur TM Tevsiat Metal Clad + Kumanda Binası

<b>Toplam Kapalı Alan</b>	1143 m <sup>2</sup>
<b>Düzenlenen Açık Alan</b>	27500 m <sup>2</sup>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	30.04.2014
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2015
<b>Toplam Maliyet</b>	4.994.064,70 TL



## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



PROJE ADI: Akyaka Trafo Merkezi  
154/33 kV 50 MVA Trafo

<b>Toplam Kapalı Alan</b>	1000 m <sup>2</sup>
<b>Düzenlenen Açık Alan</b>	19153.17 m <sup>2</sup>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	11.08.2017 tarihinde İhale Edilecektir
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2018
<b>Toplam Maliyet</b>	6.000.000,00 TL

## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



PROJE ADI: 154 kV Burdur TM Tevsiat  
154 kV 2 Fider (Akyaka, Reaktör)

<b>Toplam Kapalı Alan</b>	1143 m <sup>2</sup>
<b>Düzenlenen Açık Alan</b>	27500 m <sup>2</sup>
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	25.07.2017 tarihinde İhale Edildi
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2018
<b>Toplam Maliyet</b>	800.000,00 TL

## TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



PROJE ADI: Burdur – Akyaka EİH  
154 kv 1272 MCM

<b>Toplam Direk Sayısı</b>	
<b>Toplam Uzunluk</b>	30 km Tek Devre
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	2016 İhale Öncesi Çalışmalar devam etmektedir
<b>İş Bitim Tarihi</b>	2018
<b>Proje Karakteristiği</b>	154 kV 30 km Tek devre 1272 MCM
<b>Toplam Maliyet</b>	8.000.000,00 TL





## Doğa Koruma ve Milli Parklar


### 6. Bölge Müdürlüğü

#### Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 8
<b>Proje Bedeli</b>	: 1.542.000 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 1.542.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: --



**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi**

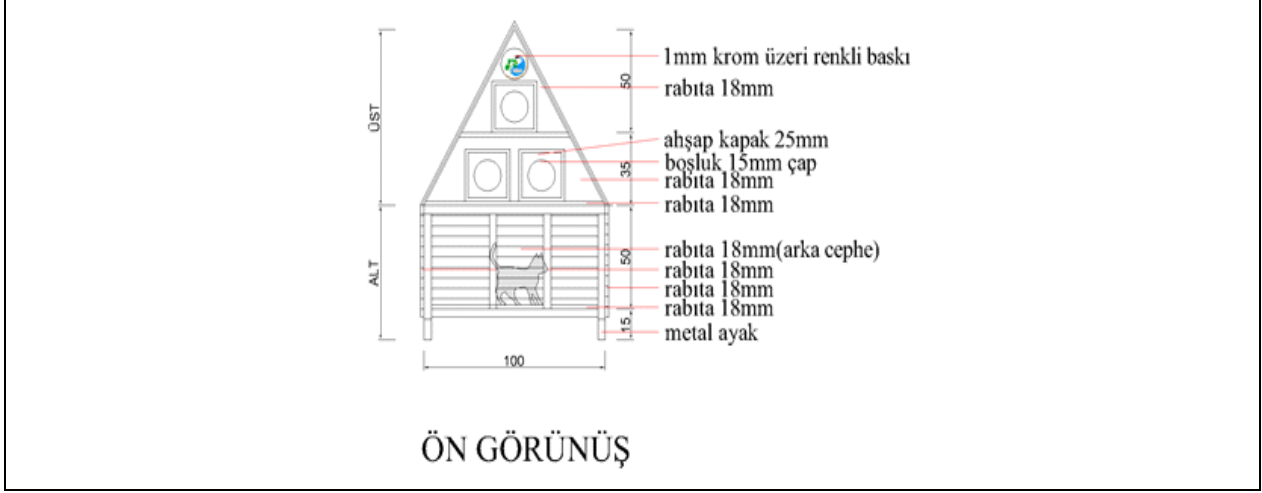

<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	01.06.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	29.08.2017
<b>Proje Tutarı</b>	38.100,00 TL(KDV Hariç)
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	----
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	45.000,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	---
<b>Karakteristiği</b>	
<b>Açıklama</b>	İş Devam Etmektedir.

**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu**



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	16.05.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	17.12.2017
<b>Proje Tutarı</b>	231.300,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	---
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	287.000,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	---
<b>Karakteristiği</b>	---
<b>Açıklama</b>	İş Devam Ediyor.

**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	14.07.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	26.12.2017
<b>Proje Tutarı</b>	700.000,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	---
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	835.000,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	---
<b>Karakteristiği</b>	---
<b>Açıklama</b>	İş Devam Ediyor.

**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
Etüt Proje Çalışmaları



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	21.07.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	24.11.2017
<b>Proje Tutarı</b>	98.500,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	---
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	140.000,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	---
<b>Karakteristiği</b>	---
<b>Açıklama</b>	İş Devam Ediyor.



# DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt Proje Çalışmaları



Yatırımın Adı	Başlama Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	2017 Yılı Ödeneği	2017 Yılı Harcaması 1
Su Sporları Yapılacak Alanların Temel Alt Yapılarının Düzenlenme İşİ	2017 2017			
Serenler Tepesi Tabiat Parkı Yol/Sanat Onarımı İşİ	2017 2017			
Kargı Köyü Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Çevre Düzenleme İşİ	2017 2017			
Salda Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Projesi	2017 2017			
		475.000	145.000	



## Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 10
<b>Proje Bedeli</b>	: 2.628.316 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 3.079.412 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 1.558.984 TL

**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**22 Adet 60 E1'lik Raya Uygun Beton Traversli Makas Temini Ve Ferşi**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:489.302,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:489.302,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	427.813,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:YOL YENİLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.

# DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

31 Adet 49 E1 Raylı Beton Traversli Makas Temini Ve Ferşi



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:1.301.712,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:1.301.712,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:1.111.181,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:YOL YENİLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.



**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
43 Adet 49 E1 Raylı Ahşap Traversli Makas Temini Ve Ferşi



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2018
<b>PROJE TUTARI</b>	:249.238,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:23-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:YOL YENİLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇANKIRI MAKAS FABRİKASINDAN MAKASLAR TEMİN EDİLMESİNE MÜTEAKİP ÇALIŞMALAR BAŞLANACAKTIR.


**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
31 Adet 49 E1 Raylı Ve 22 Adet 60 E1 Raylı Makas Topu Alımı



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:45.653,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:45.653,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:YOL YENİLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:İHALE AŞAMASINDADIR.

# DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

## Demiryolu Güzergahı Sayısallaştırılması

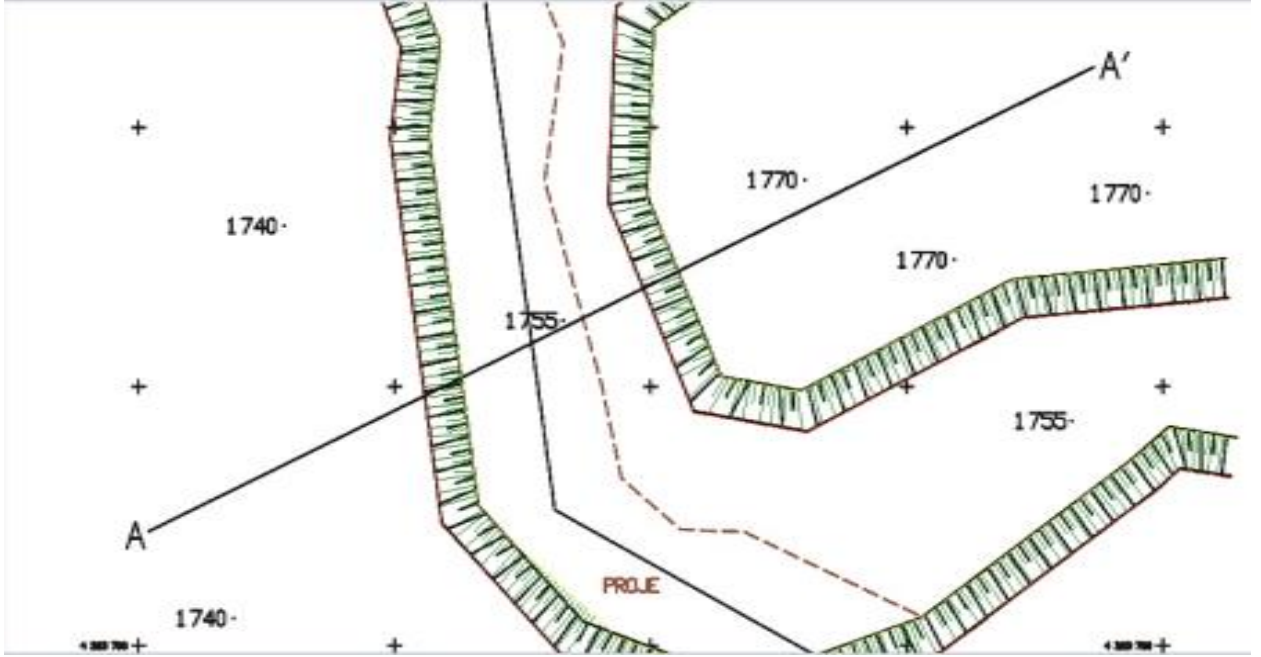

<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	: 21/08/2017 tarihinde ihalesi yapılacak
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	: -
<b>PROJE TUTARI</b>	: - (İhalesi sonuçlanmadı)
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	: 0 TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	: 89.722,88 TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	: 128,00 TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	: Demiryolu Güzergahı Sayısallaştırılması (Karakuyu-Burdur-Isparta hat kesimi)
<b>AÇIKLAMA</b>	: Toplam 150km'lik projenin 24 km'si Burdur İlinde yer almaktadır. 21/08/2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Isparta ve Burdur Gar Sahalarında Bulunan Tüm Binaların Rölöve,  
Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması



<b>Başlama Tarihi:</b>	11.08.2017
<b>Bitiş Tarihi:</b>	8.01.2018
<b>Proje Tutarı:</b>	235.000,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması:</b>	YOK
<b>2017 Yılı Ödeneği:</b>	872.514,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması:</b>	YOK
<b>Karakteristiği:</b>	Proje Hizmet Alımı
<b>Açıklama:</b>	



**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**7. BÖLGE MINTIKASINDA 4.472 ADET RAY KAYNAĞI YAPILMASI**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2018
<b>PROJE TUTARI</b>	:65.348,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:65.348,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:YOL YENİLEMELERİ VE İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:İHALE AŞAMASINDADIR.

**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**576 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE İŞARET LEVHASI YAPILMASI İŞİ**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:56.220,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:56.220,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:13.790,35-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:HEMZEMİN GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.

**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**97 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE KAPLAMA YAPILMASI**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:130.202,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:130.202,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:HEMZEMİN GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.



**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**84 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2016
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:25.725,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:25.725,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:6.072,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:HEMZEMİN GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	:ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.



**DEVLET DEMİR YOLLARI AFYON 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEMZEMİN GEÇİTLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ ETÜT VE PROJE İŞLERİ**



<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	:2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	:2017
<b>PROJE TUTARI</b>	:29.916,00-TL
<b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	:2.991,00-TL
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	:0,00-TL
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	:HEMZEMİN GEÇİT İYİLEŞTİRMELERİ
<b>AÇIKLAMA</b>	İHALE AŞAMASINDADIR.



## Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 6
<b>Proje Bedeli</b>	: 282.000.000TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 211.381.094 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 31.500.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 9.193.715 TL



















## İl Özel İdaresi Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 5 ve diğer (altyapı yatırımları 68 adet)
<b>Proje Bedeli</b>	: 82.669..643 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 3.522.902 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 16.353.691 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 6.404.086 TL

# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

## BURDUR ÇAVDIR HÜKÜMET KONAĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



Yatırımın Başlama Tarihi : 01.04.2015

Yatırımın Bitiş Tarihi : 05.11.2017

Proje Tutarı : 3.789.500,43.-TL. ( Kdv Dahil )

Önceki Yıllar Harcaması : 1.597.628,95.-TL.

2017 Yılı Ödeneği : 2.899.799,24.-TL.

2017 Yılı Harcaması : 283.567,46-TL.

Karakteristiği : Yapım İnşaatı

Açıklama : İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. Fiziki % 60 seviyesindedir.

# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

## BURDUR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



Yatırımın Başlama Tarihi	: 09.02.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	: 20.11.2018
Proje Tutarı	: 12.906.840.-TL. ( Kdv Dahil )
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 7.997.092,48.-TL.
2017 Yılı Harcaması	: 4.732.650,37.-TL.
Karakteristiği	: Yapım İnşaatı
Açıklama	: İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. Fiziki % 50 seviyesindedir.



# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES

## ALTYAPI YATIRIMLARI



Proje Tarihi	2016-2017
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	248,2 km – 25.758.000 TL
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	90,2 km – 6.532.000 TL
BSK Sathi Kaplama (Sıcak Asfalt)	79,2 km – 13.671.000 TL
İçme Suyu Şebeke Hattı, Deposu İsale ve Terfi Hattı Yapım İşi	50 Köy – 7.050.939,10 TL
Kanalizasyon Şebeke Hattı, Doğal Arıtma Tesisi, Fosseptik Çukuru	28 Köy – 1.450.000 TL
Yağmurlama Sulama Sistemi	10 Köy – 1.460.000 TL
Kilit Parke (İl Özel İdare + Köydes)	231.401 m <sup>2</sup> - 4.052.066 TL
<b>Toplam Maliyet</b>	<b>59.974.005,10 TL</b>





# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ HUZUR EVİ VE YAŞLI BAKIM REABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİ YAPIM İŞİ



Yatırımın Başlama Tarihi	: 08.08.2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	: 05.12.2016
Proje Tutarı	: 220.846,00.-TL. ( Kdv Dahil )
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 935.003,00.-TL.
2017 Yılı Harcaması	: -
Karakteristiği	: Proje Yapım İşİ
Açıklama	: Proje Çalışmaları Geçici Kabul Aşamasında Devam Ediyor. Fiziki %95 seviyesindedir.

# BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

Merkez Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Engelli Erişim İşi



Yatırımın Başlama Tarihi	: 19.07.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	: 16.09.2017
Proje Tutarı	: 55.451,64.-TL. ( Kdv Dahil )
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2017 Yılı Ödeneği	: 55.451,64.-TL.
2017 Yılı Harcaması	: -
Karakteristiği	: Yapım İnşaatı
Açıklama	: İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.Fiziki % 70 seviyesindedir.



## İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 9</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 15.192.868 TL</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: 2.393.363 TL</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 4.929.818 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: 2.794.726 TL</b>



# İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ



Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	
Önceki Yıllar Harcaması	
2017 Yılı Ödeneği	
2017 Yılı Harcaması	
Karakteristiği	
Açıklama	<p>Arsa Açıklaması: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Burdur Merkez 300 yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Mimari, Statik-İzalatörlü, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Zemin etüt, Peyzaj, Altyapı ile Proje Raporları) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi 16.05.2017 tarihinde ihale edilmiştir.</p> <p>Taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Sağlık arazisine dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir.</p>

# İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KOMPLEKSİ



Yatırımın Başlama Tarihi	04.04.2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	24.11.2017
Proje Tutarı	9.658.890,00₺
Önceki Yıllar Harcaması	2.393.363,87
2017 Yılı Ödeneği	
2017 Yılı Harcaması	2.794.726,44
Karakteristiği	Hal Sağlığı Müdürlüğü Kompleksi
Açıklama	Fiziki gerçekleşme %65 Nakdi gerçekleşme % 53

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK İLÇESİ KARAPINAR KÖYÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ**



**BURDUR**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

TRhastane.com

Yatırımın Başlama Tarihi	30.06.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	30.12.2017
Proje Tutarı	700.920,00
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	700.920,00
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Aile Sağlığı Merkezi
Açıklama	Yapım Sözleşmesi imzalandı.

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ YASSIGÜME SAĞLIK EVİ**



**BURDUR**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

TRHastane.com

Yatırımın Başlama Tarihi	30.07.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	30.01.2018
Proje Tutarı	374.060,00₺
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	374.060,00₺
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Sağlık Evi
Açıklama	Yer teslim süreci devam etmektedir.



**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ELSAZI SAĞLIK EVİ**



**BURDUR**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

TRhastane.com

Yatırımın Başlama Tarihi	06.08.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	06.02.2018
Proje Tutarı	454.300,00 ₺
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	454.300,00 ₺
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Sağlık Evi
Açıklama	

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KEMER 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU**



**BURDUR**  
**İL Sağlık Müdürlüğü**

Yatırımın Başlama Tarihi	28.06.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	28.12.2017
Proje Tutarı	527.460,00₺
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	527.460,00₺
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Açıklama	Sözleşme İmzalandı. Yer teslimi yapıldı.

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ 5 NOLU ASM**



**BURDUR**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

TRhastane.com

Yatırımın Başlama Tarihi	29.06.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	20.01.2018
Proje Tutarı	740.078,00
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	740.078,00
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Aile Sağlığı Merkezi
Açıklama	Arsa Açıklaması: Burdur Belediye Başkanlığına ait taşınmaz 17.01.2015 tarihinde Blediye Meclis kararıyla Sağlık Bakanlığına Tahsis edilmiştir. Yer teslimi yapılmış olup inşaat başlamıştır.

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**SÖĞÜT 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU**



**BURDUR**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

Yatırımın Başlama Tarihi	28.07.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	30.01.2018
Proje Tutarı	604.160,00₺
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	0
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Açıklama	



**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA ASM+TSM+112 AŞHİ**



**BURDUR**  
**İL Sağlık Müdürlüğü**

Yatırımın Başlama Tarihi	20.08.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	20.03.2018
Proje Tutarı	2.133.000 ₺
Önceki Yıllar Harcaması	0
2017 Yılı Ödeneği	2.133.000 ₺
2017 Yılı Harcaması	0
Karakteristiği	
Açıklama	Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi Ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Kompleks Binası



## **Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırımları**

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 19
<b>Proje Bedeli</b>	: 15.722.677 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 15.722.677 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 7.635.744 TL

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR-2 TM HACILAR ARASI 2x477 MCM ENH TESİS İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	1.906429,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1.906429,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	HACILAR DM-BOĞAZIÇI DM 2X477 MCM ENH TESİSİ İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	2.430.567,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	2.430.567,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR-2 TM İLE BURDUR İM-2 ARASI 2X477 MCM ENH TESİS İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	4.109.790,30
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	4.109.790,30
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	3.044.457,19
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR-2 TM İLE İM-2 VE HACILAR İRTİBAT 4X477 MCM ENH TESİS İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	868.302,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	868.302,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	591.564,96
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	GÖLHİSAR ORTA REFÜJ AYDINLATMA
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	547.208,01
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	547.208,01
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	542.174,26
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BİTTİ

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ AG-OG ELK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	198.338
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	198.338
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	194.492,48
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BİTTİ



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ KIZILSEKİ KÖYÜ AG-OG ELK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	168.747,55
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	168.747,55
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLAMADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ ÇAVDIR İLÇESİ SÖĞÜT KASABASI TOPSAHASI MEVKİİ AG-OG ELK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	423.568,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	423.568,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	374.620,68
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BİTTİ

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ GÖLHİSAR MERKEZ YERALTI AG-OG ELK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	1.193.715,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1.193.715,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	1.058.125,29
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ GÖLHİSAR İLÇESİ EĞREK MEVKİİ AG-OG ELK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	492.605,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	492.605,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	360.010,97
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ KARGI KÖYÜ MERKEZ AG-OG ELEK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	85.193,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	85.193,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	39.137,75
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ KARGI KAYADİBİ AG-OG ELEK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	28.856,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	28.856,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ ÇAVDIR İLÇESİ AMBARCIK KÖYÜ AG-OG ELEK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	353.289,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	353.289,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	260.480,65
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLAMADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ MERKEZ KOZLUCA KÖYÜ DUVARALTI MEVKİİ AG-OG ELEK TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	161.451,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	161.451,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLAMADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK DEMİRLİ KÖYÜ DEMİRLİ KÖK ELK. TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	167.992,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	167.992,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	5.888,39
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ YÜREĞİL AG-OG ELEK. TES. İŞİ.
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	108.442,90
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	108.442,90
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	109.800,87
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BİTTİ

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ KIŞLA MAHALLESİ AG-OG ELEK. TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	586.287,00
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	586.287,00
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI

## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR İLİ KURNA KÖYÜ SALA ÇAYIRI AG-OG ELEK. TES. İŞİ
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	301.041,01
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	301.041,01
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	-
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLAMADI



## AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.



<b>İŞİN ADI</b>	BURDUR KET
<b>YATIRIMIN BAŞLAMA TARİHİ</b>	01.01.2017
<b>YATIRIMIN BİTİŞ TARİHİ</b>	31.12.2017
<b>PROJE TUTARI</b>	1.590.857,86
<b>ÖNCEKİ YILAR HARCAMASI</b>	-
<b>2017 YILI ÖDENEĞİ</b>	1.590.857,86
<b>2017 YILI HARCAMASI</b>	1.054997,9
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	ENERJİ
<b>AÇIKLAMA</b>	BAŞLADI



## Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 2
<b>Proje Bedeli</b>	: 15.909.000 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 1.719.420 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 8.266.326 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 932.020 TL

## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	14.04.2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	08.05.2018
<b>Proje Tutarı</b>	5.099.000,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	2.549.500,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	932.020,42 TL
<b>Karakteristiği</b>	Engelsiz Yaşam Merkezi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
<b>Açıklama</b>	

## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	31.05.2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	30.04.2018
<b>Proje Tutarı</b>	10.810.000,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	1.719.420,22 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	5.716.826,92 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	0
<b>Karakteristiği</b>	500 Kişilik Öğrenci Yurdu
<b>Açıklama</b>	





## İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 30
<b>Proje Bedeli</b>	: 165.818.280 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 1.792.543 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 45.041.906 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: 7.616.413 TL

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ORTAOKULU (16 DERSLİKLİ)**



Yatırımın Başlama Tarihi	18/11/2014
Yatırımın Bitiş Tarihi	09/07/2016
Proje Tutarı	3.388.960,00
Önceki Yıllar Harcaması	1.792.543,00
2017 Yılı Ödeneği	0,00
2017 Yılı Harcaması	1.408.559,00
Karakteristiği	16 Derslikli
Açıklama	Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ DÜĞER ORTAOKULU (8 DERSLİKLİ)**



Yatırımın Başlama Tarihi	25/07/2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	28/08/2017
Proje Tutarı	2.329.320,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.200.000,00
2017 Yılı Harcaması	1.212.957,88
Karakteristiği	8 Derslikli
Açıklama	İnşaat devam ediyor.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ NECİP FAZIL KISAKÜREK ÇOK AMAÇLI SALON (547 KİŞİLİK)**



Yatırımın Başlama Tarihi	26/10/2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	18/02/2018
Proje Tutarı	3.500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.400.000,00
2017 Yılı Harcaması	875.892,50
Karakteristiği	8 Derslikli
Açıklama	İnşaat devam ediyor.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞLASUN MAMAK İLKOKULU (4 DERSLİK)**



Yatırımın Başlama Tarihi	09/06/2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	06/10/2017
Proje Tutarı	500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	500.000,00
2017 Yılı Harcaması	120.683,50
Karakteristiği	4 Derslikli
Açıklama	İnşaat devam ediyor.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK EMİN GÜLMEZ ORTAOKULU (32 DERSLİK)**



Yatırımın Başlama Tarihi	23/07/2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	27/05/2018
Proje Tutarı	8.700.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	2.100.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	32 Derslikli
Açıklama	İnşaat devam ediyor.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇELTİKÇİ YUNUS EMRE İLKOKULU (8 DERSLİK)**



Yatırımın Başlama Tarihi	22/07/2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	25/08/2017
Proje Tutarı	3.200.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.200.000,00
2017 Yılı Harcaması	1.206.892,04
Karakteristiği	8 Derslikli
Açıklama	İnşaat devam ediyor.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ŞİRİNEVLER ANAOKULU YEMEKHANE (50 ÖĞRENCİLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	2016
Yatırımın Bitiş Tarihi	2017
Proje Tutarı	350.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	350.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	50 Öğrencilik
Açıklama	10/08/2017 tarihinde ihalesi yapılacak.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEFENNİ ŞEHİT AYFER GÖK ANAOKULU (4 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	1.800.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	950.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	4 Derslik
Açıklama	26/06/2017 tarihinde İhalesi yapıldı, yer teslimi yapılacak.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ÇATAĞIL İLKOKULU (4 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	1.100.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.100.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	4 Derslik
Açıklama	Projesi bitti ihale aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ KOZLUCA İLKOKULUEK BİNA (4 DERSLİK)**



Yatırımın Başlama Tarihi	15/07/2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	15/09/2018
Proje Tutarı	500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	500.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	4 Derslik
Açıklama	İnşaat devam ediyor.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ HACI RAHMÎ SULTAN ORTAOKULU (20 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	9.700.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	2.400.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	20 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
MERKEZ KAYIŞZADE OSMAN EFENDİ ORTAOKULU (24 DERSLİK)



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	11.500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	2.824.486,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	24 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KARAMANLI ALİ ULVİ KURUCU ORTAOKULU (16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA MAHİR İZ ORTAOKULU (16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YEŞİLOVA KOCA YUSUF SPOR SALONU (KÜÇÜK TİP)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	1.300.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	700.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	MEB2004.63 Küçük Tip
Açıklama	Proje aşamasında.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
ÇAVDIR MUHAMMED HAMDİ YAZIR İMAM HATİP ORTAOKULU  
(16 DERSLİK)



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞLASUN CELALETİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU (16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÖLHİSAR PROF.DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAM HATİP ORTAOKULU**  
**(16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ CEMAL KAMACI SPOR SALONU (KÜÇÜK TİP)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	1.300.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	700.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	MEB2004.63 Küçük Tip
Açıklama	Proje aşamasında.



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEFENNİ NECİP FAZİL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU**  
**(16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	7.600.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.800.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ GAZİ ORTAOKULU (16 DERSLİK)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	9.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	2.400.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Proje aşamasında.

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ANADOLU LİSESİ**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	5.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	5.000.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BUCAK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 1 ATÖLYESİ**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	2.500.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	725.000,00
2017 Yılı Harcaması	2.492.792
Karakteristiği	
Açıklama	Devam Ediyor



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÖLHİSAR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	11.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	500.000,00
2017 Yılı Harcaması	
Karakteristiği	
Açıklama	Devam Ediyor

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KARAMANLI ORTA ÖĞRETİM PANSİYONU (200 Öğrenci Kapasiteli)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	5.650.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.250.000,00
2017 Yılı Harcaması	298.635
Karakteristiği	<b>200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon</b>
Açıklama	Devam Ediyor

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ GÖLLER YÖRESİ ANADOLU LİSESİ (24 Derslik+2 Atölye)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	15.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	3.000.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	24 Derslik + 2 Atölye
Açıklama	Devam Ediyor

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇAVDIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (12 Derslik)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	4.900.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.300.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	12 Derslik
Açıklama	Devam Ediyor



**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ (16 Derslikli)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	8.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	2.500.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	16 Derslik
Açıklama	Devam Ediyor

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ ORTA ÖĞRETİM PANSİYONU (200 Öğrenci Kapasiteli)**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	8.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	1.000.000,00
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	<b>200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon</b>
Açıklama	Devam Ediyor

**İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**MERKEZ SPOR SALONU**



**BURDUR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

Yatırımın Başlama Tarihi	
Yatırımın Bitiş Tarihi	
Proje Tutarı	2.000.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	0,00
2017 Yılı Ödeneği	642.420
2017 Yılı Harcaması	0,00
Karakteristiği	24 Derslik + 2 Atölye
Açıklama	Devam Ediyor



## Burdur Şeker Fabrikası Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 5</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 8.653.000 TL</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: 5.855.000 TL</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 2.755.000 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: 737.000 TL</b>



## BURDUR ŐEKER FABRİKASI

Soğutma Kulesi (5 Gözlü)



Yatırımın Başlama Tarihi: 2013

Yatırımın Bitiş Tarihi: 2013

Proje Tutarı: 450.000

Önceki Yıllar Harcaması: 450.000

2017 Yılı Ödeneđi: 0

2017 Yılı Harcaması: 0

Karakteristiđi: Rafineri

Açıklama : 2013 C 010070 Muhtelif işler Projesi Soğutma Kulesi

# BURDUR ŞEKER FABRİKASI

## Muhtelif Techizat Yenileme



Yatırımın Başlama Tarihi: 2013

Yatırımın Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Tutarı: 2.133.000

Önceki Yıllar Harcaması: 1.688.000

2017 Yılı Ödeneği: 445.000

2017 Yılı Harcaması: 86.000

Karakteristiği: Çevre Koruma

Açıklama : 2013 C 010080 Çevre Koruma Amaçlı Projeler

1- PCB İçeren Transformatörlerin Yerine Yağlı Tip Güç Transformatör Temini

2- PCB İçeren Transformatörlerin Bertaraf Edilmesi için Demontaj

Yük.Nakl.Giderleri

3-Doğalgaz Aboneliği Haberleşme Sayaç Sistemi

4-Sürekli Emisyon Ölçüm Sistem Çevrimiçi (Online) Bağ.İçin Fizibilite

5- RM-B İstasy.kazana kadar Doğalgaz tes.İçin müşav,kont,denet.hizm.1 Ad.

6- RM-B İstasy.kazan kadar Doğalgaz hattı ve 16 t/h Buhar Kazan Tem. 1Ad.

7- 100 t/h Kazan Bacası Platformuna Çıkış Merdiveni Yapılması

8- 16 t/h Kazan Dairesine Doğalgaz Kaçak ve İhbar sistemi kurulması

9- Tehlikeli Atık Geçiçi Depolama Binası

10- Atıksu Arıt. Tes. Deşarj Hattı ve Çamur Havuz. Tes.Atıksu Basma Hat. Yeni.

## BURDUR ŞEKER FABRİKASI

### Lojman Tadilatı



Yatırımın Başlama Tarihi: 2014

Yatırımın Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Tutarı: 60.000

Önceki Yıllar Harcaması: 17.000

2017 Yılı Ödeneği: 0

2017 Yılı Harcaması: 0

Karakteristiği: Güçlendirme

Açıklama : 2014 C 010020 Muhtelif İşler Projeler-İnşaat

## BURDUR ŐEKER FABRİKASI



Yatırımın Başlama Tarihi: 2016

Yatırımın Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Tutarı: 3.700.000

Önceki Yıllar Harcaması: 3.700.000

2017 Yılı Ödeneđi: 0

2017 Yılı Harcaması: 0

Karakteristiđi: Otomasyon

Açıklama : 2016 C 010010 Muhtelif İşler Projeler-Makine Teçhizat

1-Ham Fabrika ve Rafineri Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi

2 -35-27 Atü Basınç Düşürme Ventili

3- Tambur Tipi Taş Tutucu (1 Adet)



## BURDUR ŞEKER FABRİKASI



Yatırımın Başlama Tarihi: 2017

Yatırımın Bitiş Tarihi: Devam Ediyor

Proje Tutarı: 2.310.000

Önceki Yıllar Harcaması: 0

2017 Yılı Ödeneği: 2.310.000

2017 Yılı Harcaması: 651.000

Karakteristiği: Üretim

Açıklama : 2017 C 010020 Muhtelif İşler Projeler

- 1-Tambur Tipi Taş Tutucu Temeli İnşaat İşleri
- 2-Pancar boşaltma Makinası Tek Platformlu 60 Tonluk
- 3- Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi
- 4-Yaş Pancar Posası Paketleme Makinası Montajı (İnşaat,Mekanik,Elektrik vs)
- 5-Ham Fabrika ve Rafineri Otomasyon Yenilenmesi İşinin Demontaj,Kablaj,Montaj Test ve devreye alma
- 6-Kristal Yeşil Şeker Şurup Depolarının Cr-Ni Olarak Yenilenmesi
- 7-Koyu Şerbet Deposunun Cr-Ni Olarak Yenilenmesi (1 Adet)
- 8-Mobil Makaslı Platform (1 Adet)
- 9-Ham Fabrika ve Rafineri Kısımlarındaki Muht. İstas.Yağlama Sis.Tam Otomatik Sis.Dönüş.
- 10-Fabrika Geneli Yangın Tesisatı ve Merkezi Yangın İhbar Sistemi Kurulması
- 11-Kirli Şeker Eritme Depolarının Cr-Ni Olarak Yenilenmesi
- 12-Merkez Böl. Çiftçi,Müteahhit ve Küspe Kantarlarına Kameralı Plaka Tanıma Sistemi Kurulumu.



## Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 65
<b>Proje Bedeli</b>	: 9.720.961 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: --
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: --
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: --

**GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE DEPOLANMASI PROJESİ**



ADI	İşe Başlama Tarihi	İşin Bitiş Tarihi	Toplam Maliyet TL.
Suat ATALAY Çelik Silo	26.05.2017	Devam ediyor	1.498.075
Yapım Kaynağı	%50 Yatırımcı	%50 Bakanlık	

**GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ÇİFTLİK FALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJELERİ**



ADI	İşe Başlama Tarihi	İşin Bitiş Tarihi	Toplam Maliyet TL.
Yüksek Tünel (Sera) Projeleri 18 Adet	26.05.2017	Devam ediyor	6.354.795
Makine ve Ekipman Projeleri 46 Adet	26.05.2017	Devam Ediyor	1.868.091
Toplam proje sayısı 64 Adet			8.222.886
Yapım Kaynağı	%50 Yatırımcı	%50 Bakanlık	





## Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	: 3
<b>Proje Bedeli</b>	: 12.493.000 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	: 7.080.389 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	: 4.157.000 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	: --

## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur Merkez Kapalı Yüzme Havuzu 2. İkmal İnşaatı



Yatırımın Başlama Tarihi	15.05.2017 (Son yer teslimi)
Yatırımın Bitiş Tarihi	19.06.2018
Proje Tutarı	2.049.000,00 TL (Sözleşme Tutarı)
Önceki Yıllar Harcaması	4.075.567,29 TL
2017 Yılı Ödeneği	1.000.000,00 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiği	Betonarme Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
Açıklama	Kaba inşaat tamamlanmış olup, boya-çatı-seramik-çevre düzenlemesi ve mekanik imalatlar devam etmektedir.

## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur Merkez Gazi Atatürk Stadı Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapım İşı



Yatırımın Başlama Tarihi	02.06.2017
Yatırımın Bitiş Tarihi	29.10.2017
Proje Tutarı	657.000,00 TL (Sözleşme Tutarı)
Önceki Yıllar Harcaması	-
2017 Yılı Ödeneđi	657.000,00 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiđi	Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası
Açıklama	Drenaj ve mıcır serimi tamamlanmış olup sentetik çimli halı serimine geçilecektir.

## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur-Merkez 3000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi



Yatırımın Başlama Tarihi	27.07.2015
Yatırımın Bitiş Tarihi	14.08.2017
Proje Tutarı	9.737.000,00 TL (Sözleşme Tutarı)
Önceki Yıllar Harcaması	3.004.822,81 TL
2017 Yılı Ödeneği	2.500.000,00 TL
2017 Yılı Harcaması	-
Karakteristiği	Betonarme 3000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu
Açıklama	Kaba inşaatı tamamlanma aşamasındadır.





## İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Yatırımları

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 3</b>
<b>Proje Bedeli</b>	<b>: 9.817.284 TL</b>
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	<b>: 1.705.972 TL</b>
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	<b>: 8.128.811 TL</b>
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	<b>: 94.811 TL</b>

**İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**  
MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	2017
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Proje Tutarı</b>	40.000.000,00 TL (5 il için)
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	-
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	40.000.000,00 TL (5 il için)
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	-
<b>Karakteristiği</b>	
<b>Açıklama</b>	Müdürlüğümüz Hizmet Binası Yapımı İş'i toplam 5 il için 40.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Burdur AFAD Müdürlüğü binası proje ihalesi devam etmektedir.

## İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Bucak Kızıllı Köyü Afet Konutları Altyapısı



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	2016
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Proje Tutarı</b>	899.434,70 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	807.372,93 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	109.561,77 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	92.061,77 TL
<b>Karakteristiği</b>	
<b>Açıklama</b>	Bucak Kızıllı Köyü Afet Konutları Altyapısı İş'i. İş'in Geçici Kabul eksiklikleri tamamlanmaktadır.

## İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Bucak Kızıllı Köyü Afet Konutları (Konut Yapımı)



<b>Yatırımın Başlama Tarihi</b>	2014
<b>Yatırımın Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Proje Tutarı</b>	917.850,00 TL
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	898.600 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	19.250,00 TL
<b>2017 Yılı Harcaması</b>	2.750,00 TL
<b>Karakteristiği</b>	
<b>Açıklama</b>	Evini Yapana Yardım Metodu ile 19 Konut tamamlanmıştır. Konutunu kendisi yapmak isteyen 1 vatandaşımızın inşaatı devam etmektedir.
